

# 설악동야영장 노후영지 정비 및 분리수거장 설치공사 계획(안)

(’26. 7., 탐방시설과)

- ◆ 설악동야영장 내 노후영지를 정비하고 분리수거장 추가 설치를 통해 야영장 개방 전 이용객 편의 증진 도모

## 1. 사업개요

- ☐ 사업명: 설악동야영장 노후영지 정비 및 분리수거장 설치공사
- ☐ 사업위치: 강원 속초시 청봉로 25, 설악동야영장 일원
- ☐ 사업내용: 노후영지 6개소 정비, 분리수거장 2개소 설치
- ☐ 소요예산: 금80,023,160원(금팔천이만삼천일백육십원) ※ 부가세포함

| 합계          | 도급공사비       | 관급자재비(도급자 관급) |
|-------------|-------------|---------------|
| 80,023,160원 | 54,625,160원 | 25,398,000원   |

- ☐ 사업기간: 착수일로부터 20일
- ☐ 예산과목: 관)국립공원사업 항)목)공원시설설치·정비 세목)야영장조성및정비


## 2. 위치도



설악동야영장 샤워장 위치도

### 3. 현황

- ☐ 기존 데크영지(A7~A12) 구간은 전면개선사업에서 제외되었으나, 데크 부식, 수축·팽창으로 인해 노후되어 보수가 필요한 실정
- ☐ 기존 재활용장은 야외 노출형 보관방식으로 운영되어 악취·해충 발생 및 수거 효율이 저하되는 문제가 발생
- ☐ 이용 편의 및 수거 효율을 위해 재활용 분리배출시설 설치 필요
- ☐ 현황사진

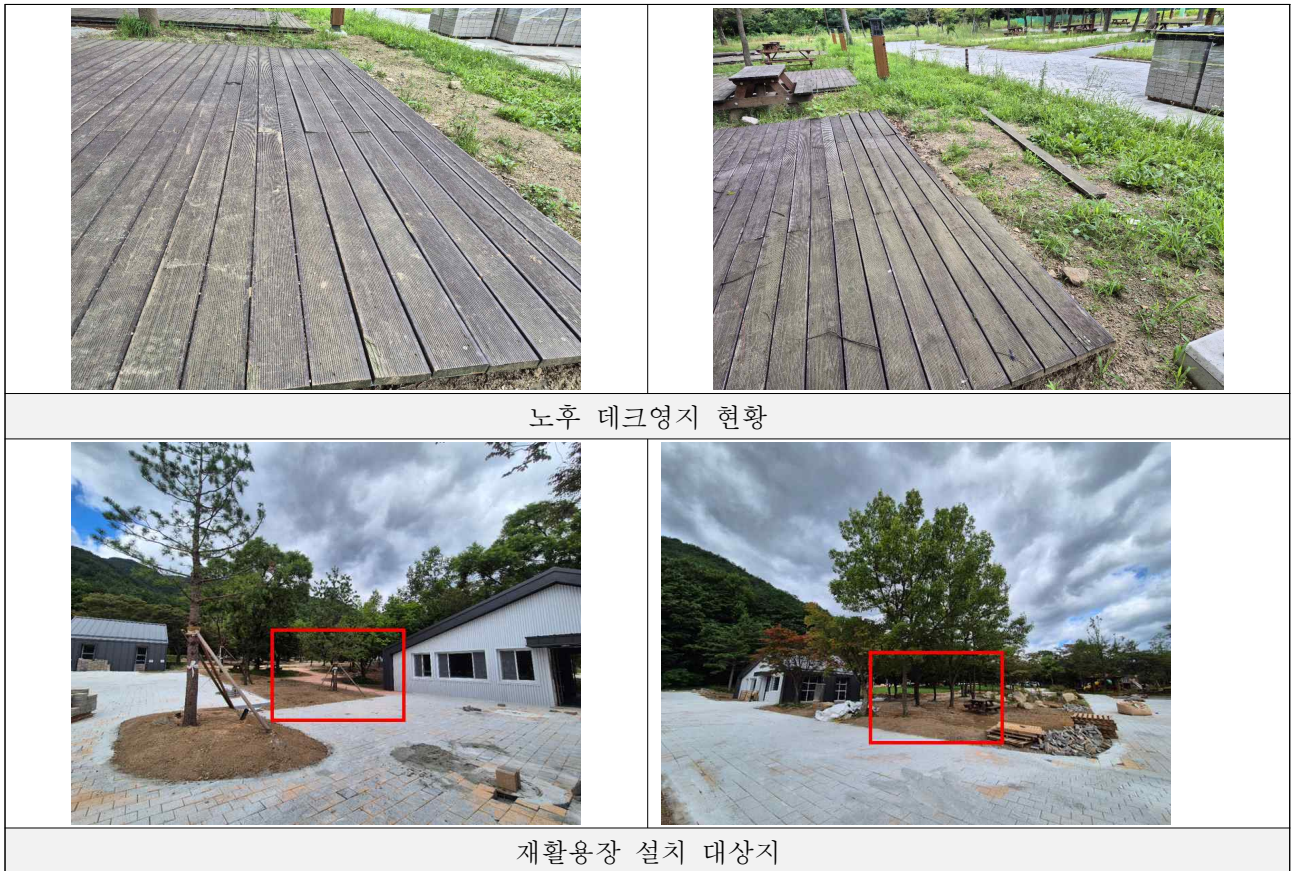

### 4. 추진계획

| 구분   | 금액(원)      | 세부내용                                     | 비고 |
|------|------------|------------------------------------------|----|
| 계    | 80,023,160 |                                          |    |
| 도급공사 | 54,625,160 | - 데크영지 철거 및 교체 6개소<br>- 재활용장 설치 2개소      |    |
| 관급자재 | 25,398,000 | - 합성목재 249m <sup>2</sup> 구매(단가 10,2000원) |    |

끝.

붙임

재활용장 도면




참고 사진


## 설악산국립공원 분리수거장 w3600 \* d1950 \* h2300

### [제품사양]


- 1.재질: 갈바, 스틸 각파이프
- 2.색상: 블랙, 아이보리(분체도장)
- 3.벽체: EGI타공판, 렉산, 합성목 20T
- 4.바닥: 없음
- 5.도어: 없음
- 6.하단부: 앵카용 수평 조절좌
- 7.정면 상부 타공판: 블랙(분체도장)
- 8.후면 타공판:아이보리(분체도장)
- 9.지붕: 브라운 복층 렉산 10T
10. 사인물: 미정
11. 수량 2EA

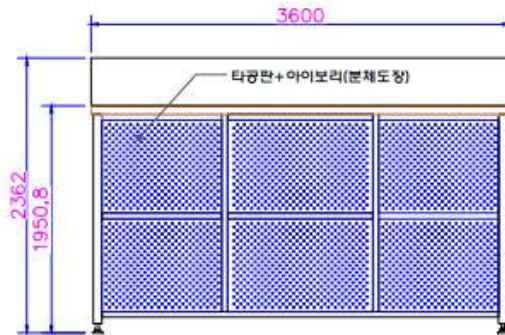


후면도

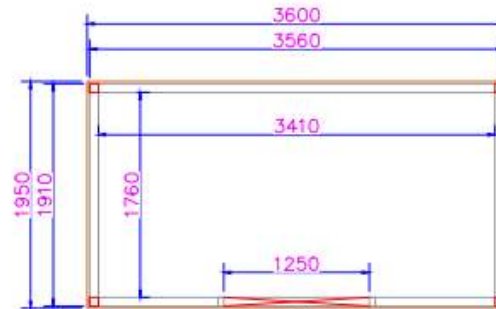


평면도

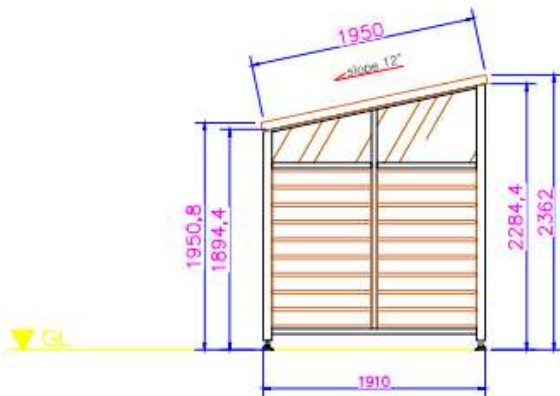

좌측면도

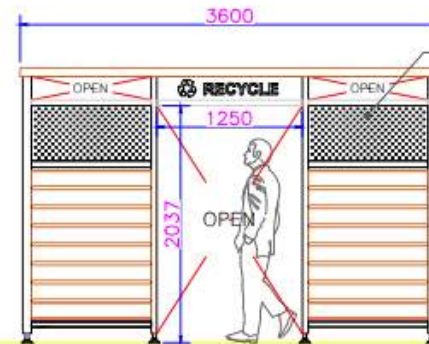

정면도

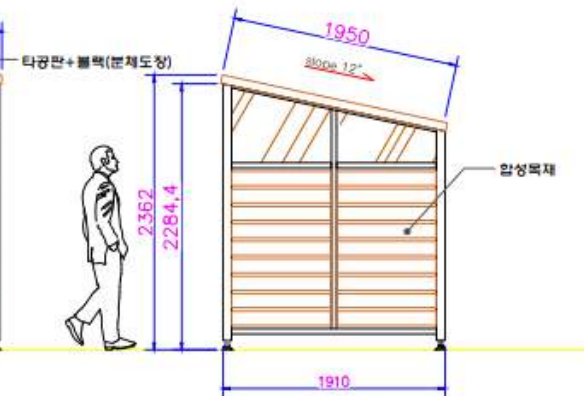

우측면도
